معرف		اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	انهاء
1		**تشكيل فريق الإدارة الرئيسي :**	**63 ي**	**2018-01-01**	**2018-03-19**
2		تحديد مهام الفرق التي سيتم تشكيلها	3 ي	2018-01-01	2018-01-04
3		الإشراف على باقي الفرق حتى إتمام	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
4		تقديم الدعم اللازم للفرق	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
5		العمل على حل المختنقات وإعداد	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
6		**تشكيل فريق البنية التحتية والاتصالات :**	**50 ي**	**2018-01-04**	**2018-03-06**
7		التواصل مع شركات التقنية العامة	1 ش.	2018-01-04	2018-01-29
8		إعداد قائمة بالجهات التي تتبع مركز	1 أ.	2018-01-04	2018-01-10
9		وضع أساس اتفاق بين الشركة مقدمة	2 أ.	2018-01-29	2018-02-10
10		تجهيز خادمات الشبكة الرئيسية	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
11		تجهيز خادم البريد الإلكتروني	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
12		**إعداد تصور بناء بوابة تبادل**	**10 ي**	**2018-02-22**	**2018-03-06**
13		تطبيقات الأرشفة وإدارة المستندات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
14		موقع داخلي لتبادل البيانات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
15		**تشكيل فريق البيانات :**	**65.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-04-04**
16		**جمع البيانات**	**20.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-02-07**
17		جمع التقارير من الجهات كما هي	3 أ.	2018-01-21	2018-02-07
18		إعداد نماذج تقارير مبدئية لكافة	1 أ.	2018-01-14	2018-01-20
19		دراسة التقارير السابقة (تقارير سبق	4 أ.	2018-01-14	2018-02-07
20		**تصميم المخرجات**	**45 ي**	**2018-02-07**	**2018-04-04**
21		تصميم نماذج مواحدة للتقارير التي	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
22		تصميم آلية إلكترونية لتجميع	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
23		تصميم النظام الذي يتولى جمع	1 ش.	2018-03-11	2018-04-04
24		تحليل البيانات وتصميم التقارير	3 أ.	2018-03-11	2018-03-29
25		**تشكيل فريق التنظيم الإداري :**	**45 ي**	**2018-01-14**	**2018-03-10**
26		حصر مراكز المعلومات بالقطاعات	2 أ.	2018-01-14	2018-01-25
27		وضع تصور موحد لهيكلية مركز	2 أ.	2018-01-25	2018-02-07
28		كتابة الاختصاصات والمهام للوحدات	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
29		وضع منهجية موحدة لعمل مراكز	2 أ.	2018-02-25	2018-03-10
30		وضع آلية التواصل بين مركز	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
31		**ورشة عمل (مركز المعلومات والتوثيق**	**29 ي**	**2018-02-07**	**2018-03-15**
32		إعداد برنامج عمل الورشة	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
33		(الأعمال اللوجستية)الإعداد التنظيمي	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
34		تنفيذ الورشة	1 ي	2018-03-11	2018-03-12
35		تحويل التوصيات إلى برنامج عمل	3 ي	2018-03-12	2018-03-15

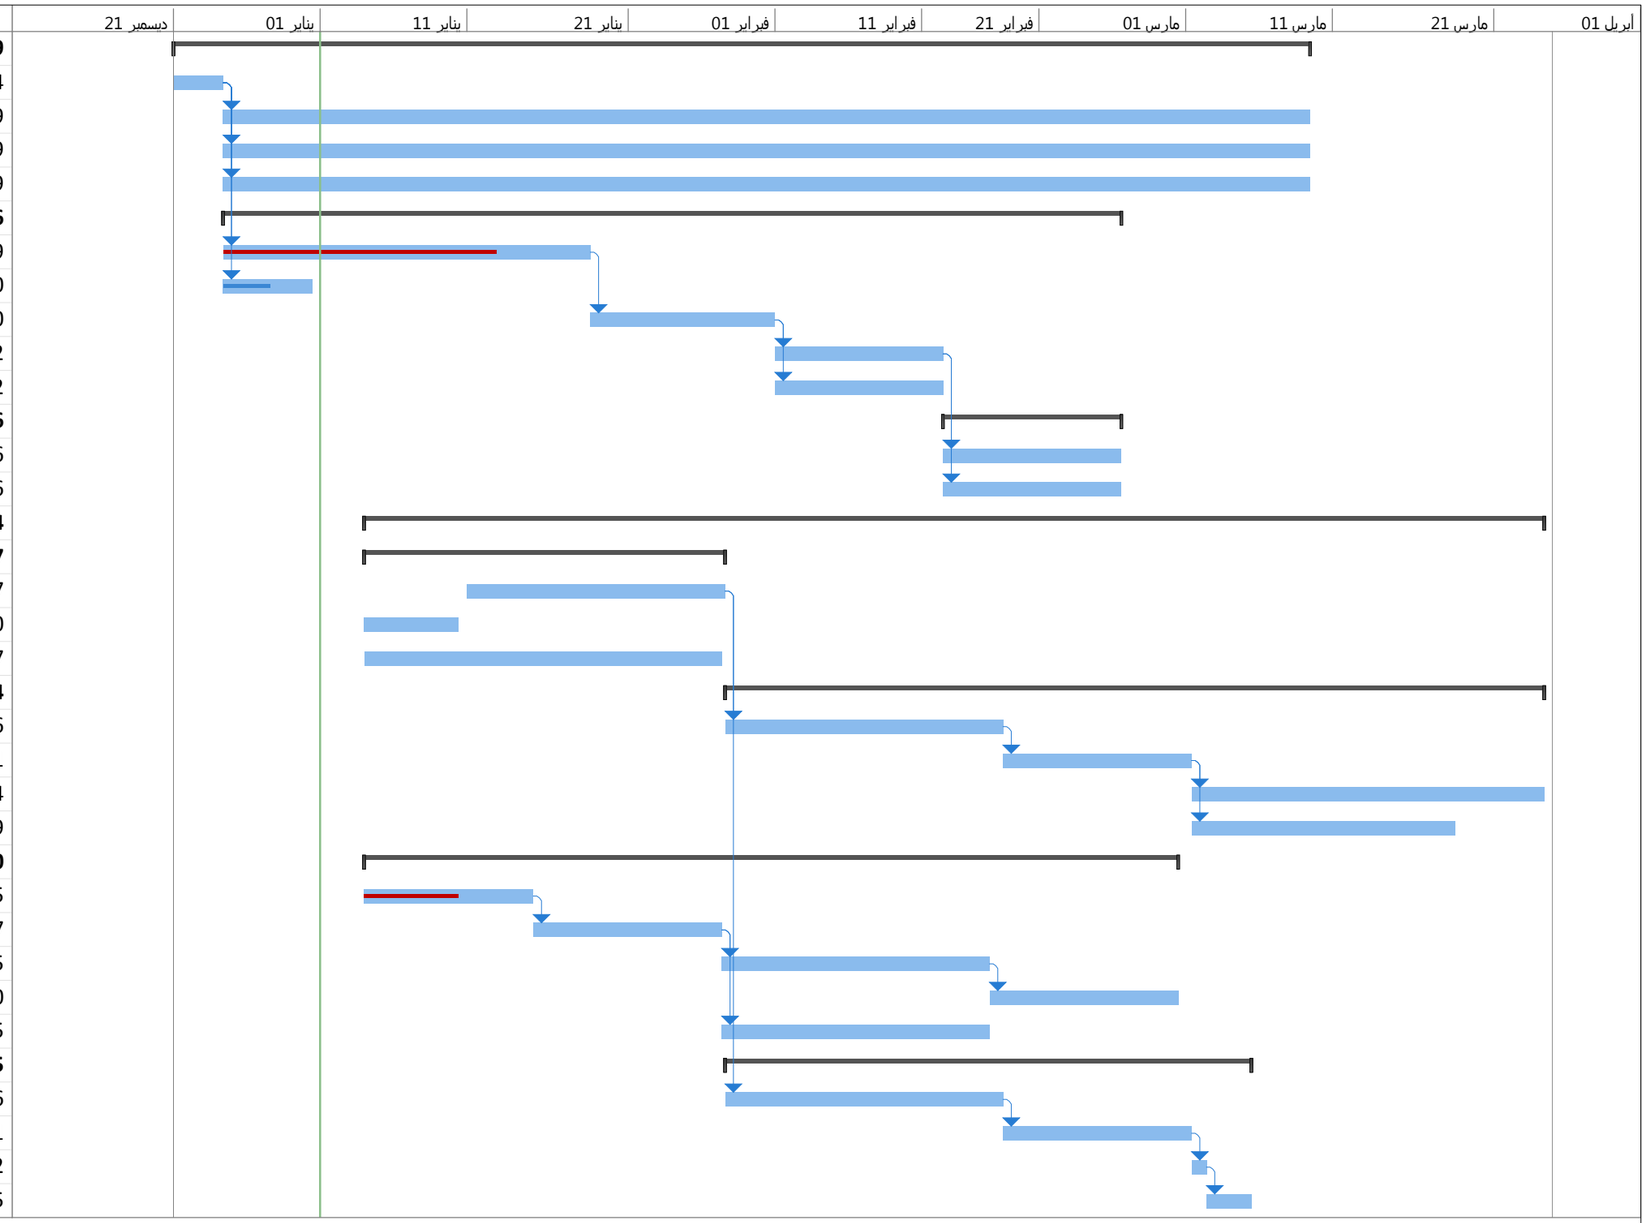

Project: Simple Project Plan
Date: 2018-01-11

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

معرف		اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	انهاء
1		**تشكيل فريق الإدارة الرئيسي :**	**63 ي**	**2018-01-01**	**2018-03-19**
2		تحديد مهام الفرق التي سيتم تشكيلها	3 ي	2018-01-01	2018-01-04
3		الإشراف على باقي الفرق حتى إتمام	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
4		تقديم الدعم اللازم للفرق	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
5		العمل على حل المختنقات وإعداد	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
6		**تشكيل فريق البنية التحتية والاتصالات :**	**50 ي**	**2018-01-04**	**2018-03-06**
7		التواصل مع شركات التقنية العامة	1 ش.	2018-01-04	2018-01-29
8		إعداد قائمة بالجهات التي تتبع مركز	1 أ.	2018-01-04	2018-01-10
9		وضع أساس اتفاق بين الشركة مقدمة	2 أ.	2018-01-29	2018-02-10
10		تجهيز خادمات الشبكة الرئيسية	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
11		تجهيز خادم البريد الإلكتروني	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
12		**إعداد تصور بناء بوابة تبادل**	**10 ي**	**2018-02-22**	**2018-03-06**
13		تطبيقات الأرشفة وإدارة المستندات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
14		موقع داخلي لتبادل البيانات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
15		**تشكيل فريق البيانات :**	**65.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-04-04**
16		**جمع البيانات**	**20.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-02-07**
17		جمع التقارير من الجهات كما هي	3 أ.	2018-01-21	2018-02-07
18		إعداد نماذج تقارير مبدئية لكافة	1 أ.	2018-01-14	2018-01-20
19		دراسة التقارير السابقة (تقارير سبق	4 أ.	2018-01-14	2018-02-07
20		**تصميم المخرجات**	**45 ي**	**2018-02-07**	**2018-04-04**
21		تصميم نماذج مواحدة للتقارير التي	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
22		تصميم آلية إلكترونية لتجميع	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
23		تصميم النظام الذي يتولى جمع	1 ش.	2018-03-11	2018-04-04
24		تحليل البيانات وتصميم التقارير	3 أ.	2018-03-11	2018-03-29
25		**تشكيل فريق التنظيم الإداري :**	**45 ي**	**2018-01-14**	**2018-03-10**
26		حصر مراكز المعلومات بالقطاعات	2 أ.	2018-01-14	2018-01-25
27		وضع تصور موحد لهيكلية مركز	2 أ.	2018-01-25	2018-02-07
28		كتابة الاختصاصات والمهام للوحدات	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
29		وضع منهجية موحدة لعمل مراكز	2 أ.	2018-02-25	2018-03-10
30		وضع آلية التواصل بين مركز	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
31		**ورشة عمل (مركز المعلومات والتوثيق**	**29 ي**	**2018-02-07**	**2018-03-15**
32		إعداد برنامج عمل الورشة	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
33		(الأعمال اللوجستية)الإعداد التنظيمي	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
34		تنفيذ الورشة	1 ي	2018-03-11	2018-03-12
35		تحويل التوصيات إلى برنامج عمل	3 ي	2018-03-12	2018-03-15

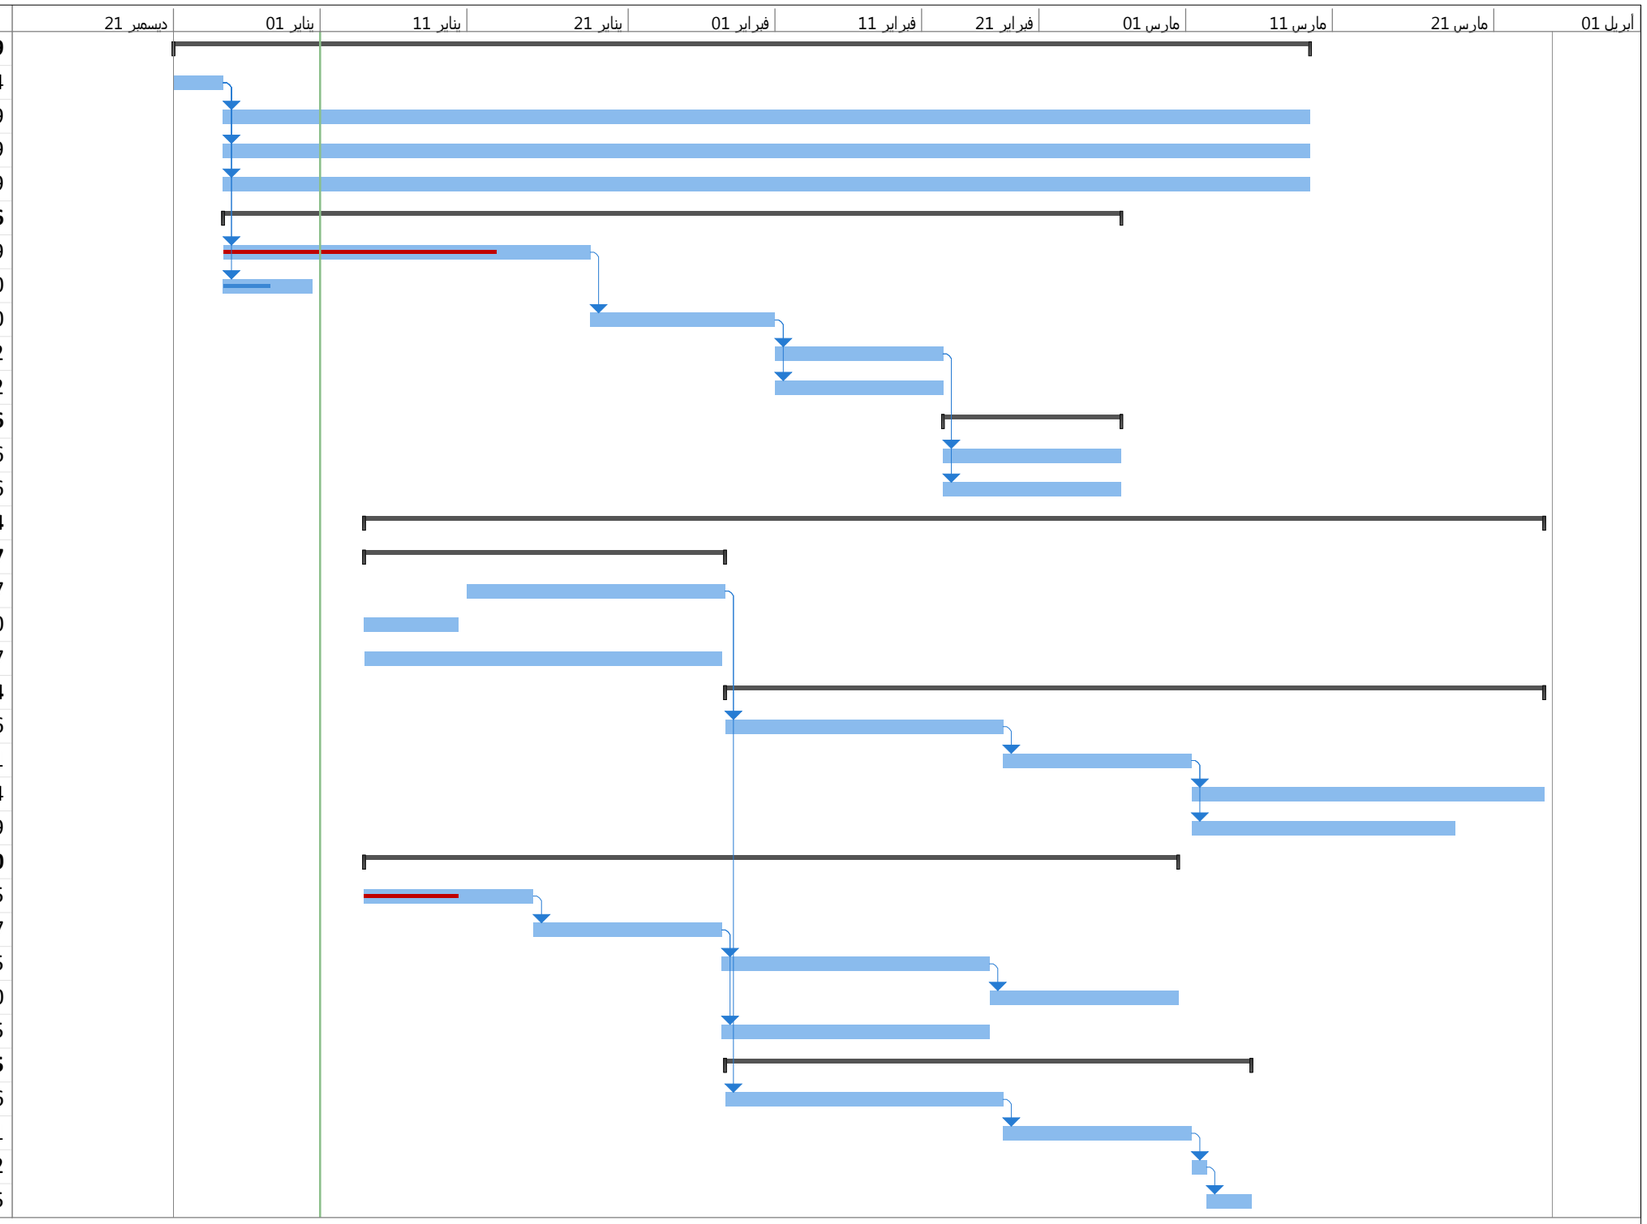

Project: Simple Project Plan
Date: 2018-01-11

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

معرف	اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	انهاء
1	**تشكيل فريق الإدارة الرئيسي :**	**63 ي**	**2018-01-01**	**2018-03-19**
2	تحديد مهام الفرق التي سيتم تشكيلها	3 ي	2018-01-01	2018-01-04
3	الإشراف على باقي الفرق حتى إتمام	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
4	تقديم الدعم اللازم للفرق	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
5	العمل على حل المختنقات وإعداد	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
6	**تشكيل فريق البنية التحتية والاتصالات :**	**50 ي**	**2018-01-04**	**2018-03-06**
7	التواصل مع شركات التقنية العامة	1 ش.	2018-01-04	2018-01-29
8	إعداد قائمة بالجهات التي تتبع مركز	1 أ.	2018-01-04	2018-01-10
9	وضع أساس اتفاق بين الشركة مقدمة	2 أ.	2018-01-29	2018-02-10
10	تجهيز خادمات الشبكة الرئيسية	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
11	تجهيز خادم البريد الإلكتروني	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
12	**إعداد تصور بناء بوابة تبادل**	**10 ي**	**2018-02-22**	**2018-03-06**
13	تطبيقات الأرشفة وإدارة المستندات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
14	موقع داخلي لتبادل البيانات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
15	**تشكيل فريق البيانات :**	**65.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-04-04**
16	**جمع البيانات**	**20.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-02-07**
17	جمع التقارير من الجهات كما هي	3 أ.	2018-01-21	2018-02-07
18	إعداد نماذج تقارير مبدئية لكافة	1 أ.	2018-01-14	2018-01-20
19	دراسة التقارير السابقة (تقارير سبق	4 أ.	2018-01-14	2018-02-07
20	**تصميم المخرجات**	**45 ي**	**2018-02-07**	**2018-04-04**
21	تصميم نماذج مواحدة للتقارير التي	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
22	تصميم آلية إلكترونية لتجميع	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
23	تصميم النظام الذي يتولى جمع	1 ش.	2018-03-11	2018-04-04
24	تحليل البيانات وتصميم التقارير	3 أ.	2018-03-11	2018-03-29
25	**تشكيل فريق التنظيم الإداري :**	**45 ي**	**2018-01-14**	**2018-03-10**
26	حصر مراكز المعلومات بالقطاعات	2 أ.	2018-01-14	2018-01-25
27	وضع تصور موحد لهيكلية مركز	2 أ.	2018-01-25	2018-02-07
28	كتابة الاختصاصات والمهام للوحدات	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
29	وضع منهجية موحدة لعمل مراكز	2 أ.	2018-02-25	2018-03-10
30	وضع آلية التواصل بين مركز	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
31	**ورشة عمل (مركز المعلومات والتوثيق**	**29 ي**	**2018-02-07**	**2018-03-15**
32	إعداد برنامج عمل الورشة	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
33	(الأعمال اللوجستية)الإعداد التنظيمي	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
34	تنفيذ الورشة	1 ي	2018-03-11	2018-03-12
35	تحويل التوصيات إلى برنامج عمل	3 ي	2018-03-12	2018-03-15

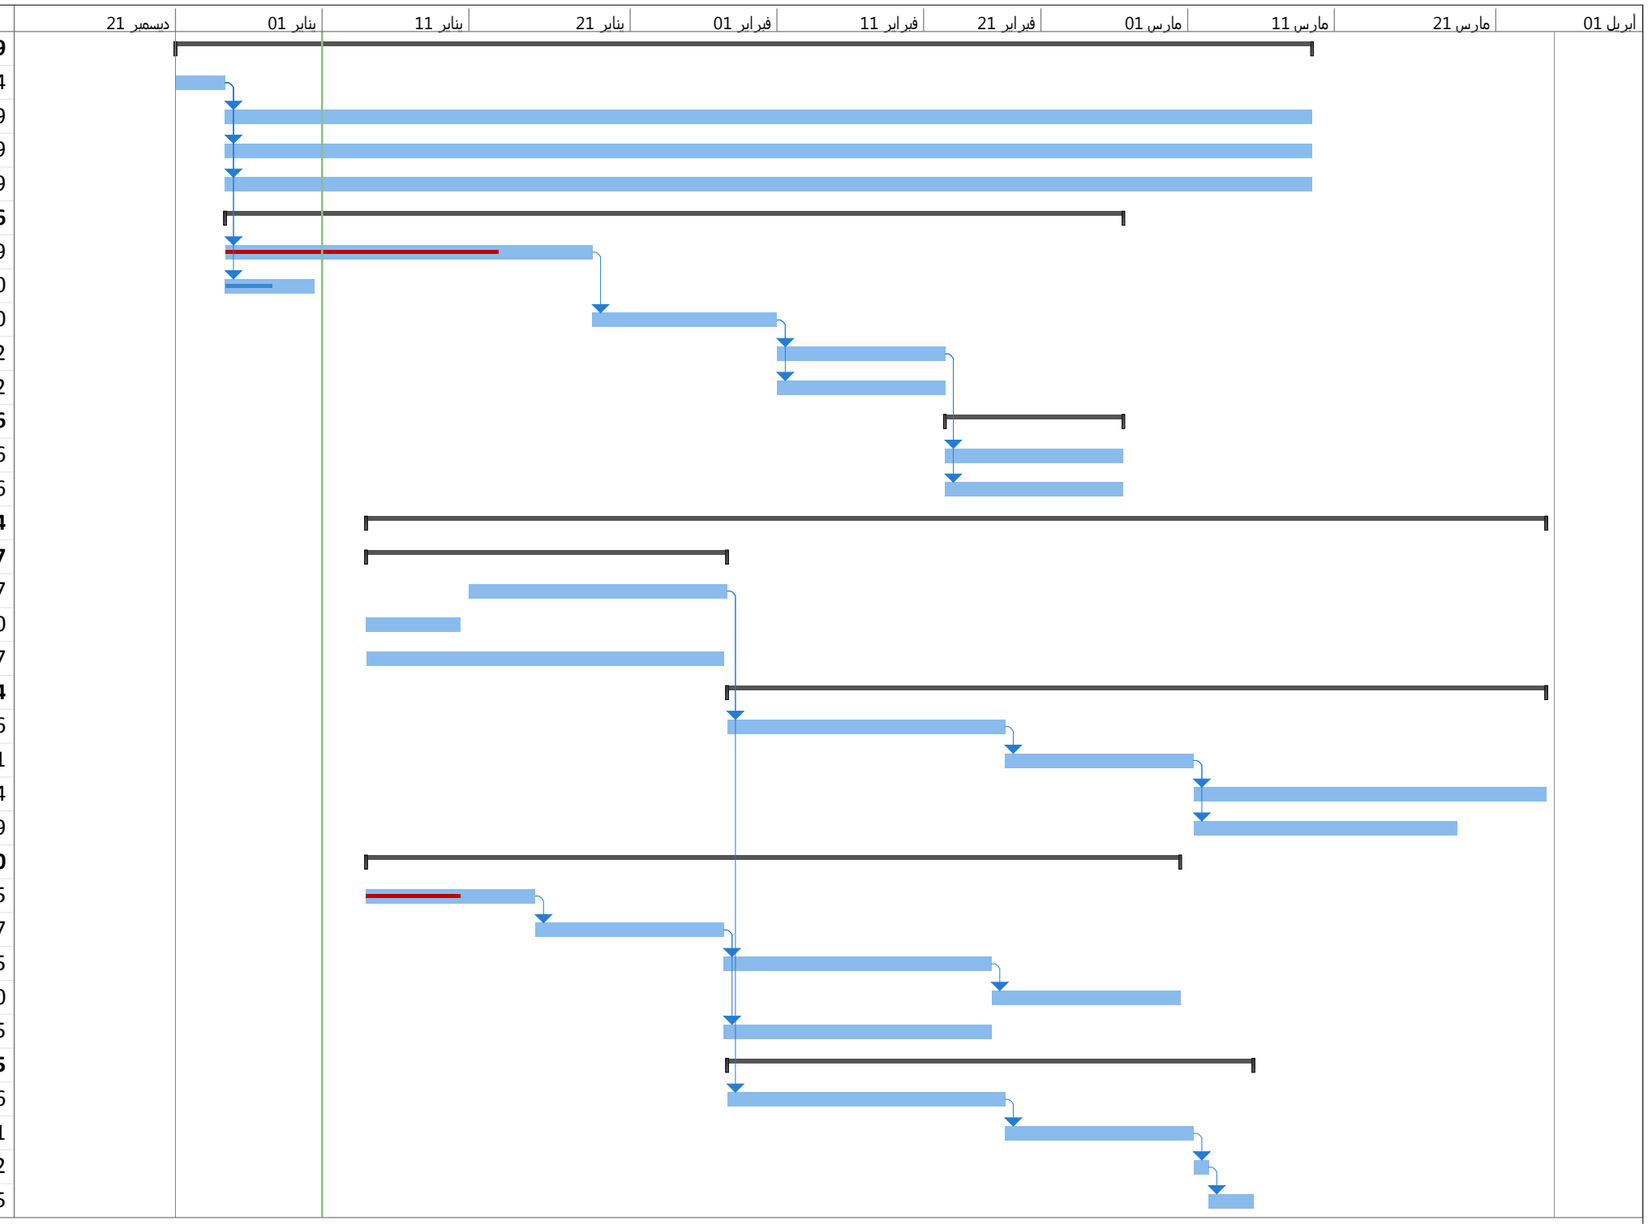

Project: Simple Project Plan
Date: 2018-01-11

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

معرف		اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	انهاء
1		**تشكيل فريق الإدارة الرئيسي :**	**63 ي**	**2018-01-01**	**2018-03-19**
2		تحديد مهام الفرق التي سيتم تشكيلها	3 ي	2018-01-01	2018-01-04
3		الإشراف على باقي الفرق حتى إتمام	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
4		تقديم الدعم اللازم للفرق	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
5		العمل على حل المختنقات وإعداد	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
6		**تشكيل فريق البنية التحتية والاتصالات :**	**50 ي**	**2018-01-04**	**2018-03-06**
7		التواصل مع شركات التقنية العامة	1 ش.	2018-01-04	2018-01-29
8		إعداد قائمة بالجهات التي تتبع مركز	1 أ.	2018-01-04	2018-01-10
9		وضع أساس اتفاق بين الشركة مقدمة	2 أ.	2018-01-29	2018-02-10
10		تجهيز خادمات الشبكة الرئيسية	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
11		تجهيز خادم البريد الإلكتروني	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
12		**إعداد تصور بناء بوابة تبادل**	**10 ي**	**2018-02-22**	**2018-03-06**
13		تطبيقات الأرشفة وإدارة المستندات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
14		موقع داخلي لتبادل البيانات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
15		**تشكيل فريق البيانات :**	**65.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-04-04**
16		**جمع البيانات**	**20.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-02-07**
17		جمع التقارير من الجهات كما هي	3 أ.	2018-01-21	2018-02-07
18		إعداد نماذج تقارير مبدئية لكافة	1 أ.	2018-01-14	2018-01-20
19		دراسة التقارير السابقة (تقارير سبق	4 أ.	2018-01-14	2018-02-07
20		**تصميم المخرجات**	**45 ي**	**2018-02-07**	**2018-04-04**
21		تصميم نماذج مواحدة للتقارير التي	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
22		تصميم آلية إلكترونية لتجميع	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
23		تصميم النظام الذي يتولى جمع	1 ش.	2018-03-11	2018-04-04
24		تحليل البيانات وتصميم التقارير	3 أ.	2018-03-11	2018-03-29
25		**تشكيل فريق التنظيم الإداري :**	**45 ي**	**2018-01-14**	**2018-03-10**
26		حصر مراكز المعلومات بالقطاعات	2 أ.	2018-01-14	2018-01-25
27		وضع تصور موحد لهيكلية مركز	2 أ.	2018-01-25	2018-02-07
28		كتابة الاختصاصات والمهام للوحدات	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
29		وضع منهجية موحدة لعمل مراكز	2 أ.	2018-02-25	2018-03-10
30		وضع آلية التواصل بين مركز	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
31		**ورشة عمل (مركز المعلومات والتوثيق**	**29 ي**	**2018-02-07**	**2018-03-15**
32		إعداد برنامج عمل الورشة	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
33		(الأعمال اللوجستية)الإعداد التنظيمي	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
34		تنفيذ الورشة	1 ي	2018-03-11	2018-03-12
35		تحويل التوصيات إلى برنامج عمل	3 ي	2018-03-12	2018-03-15

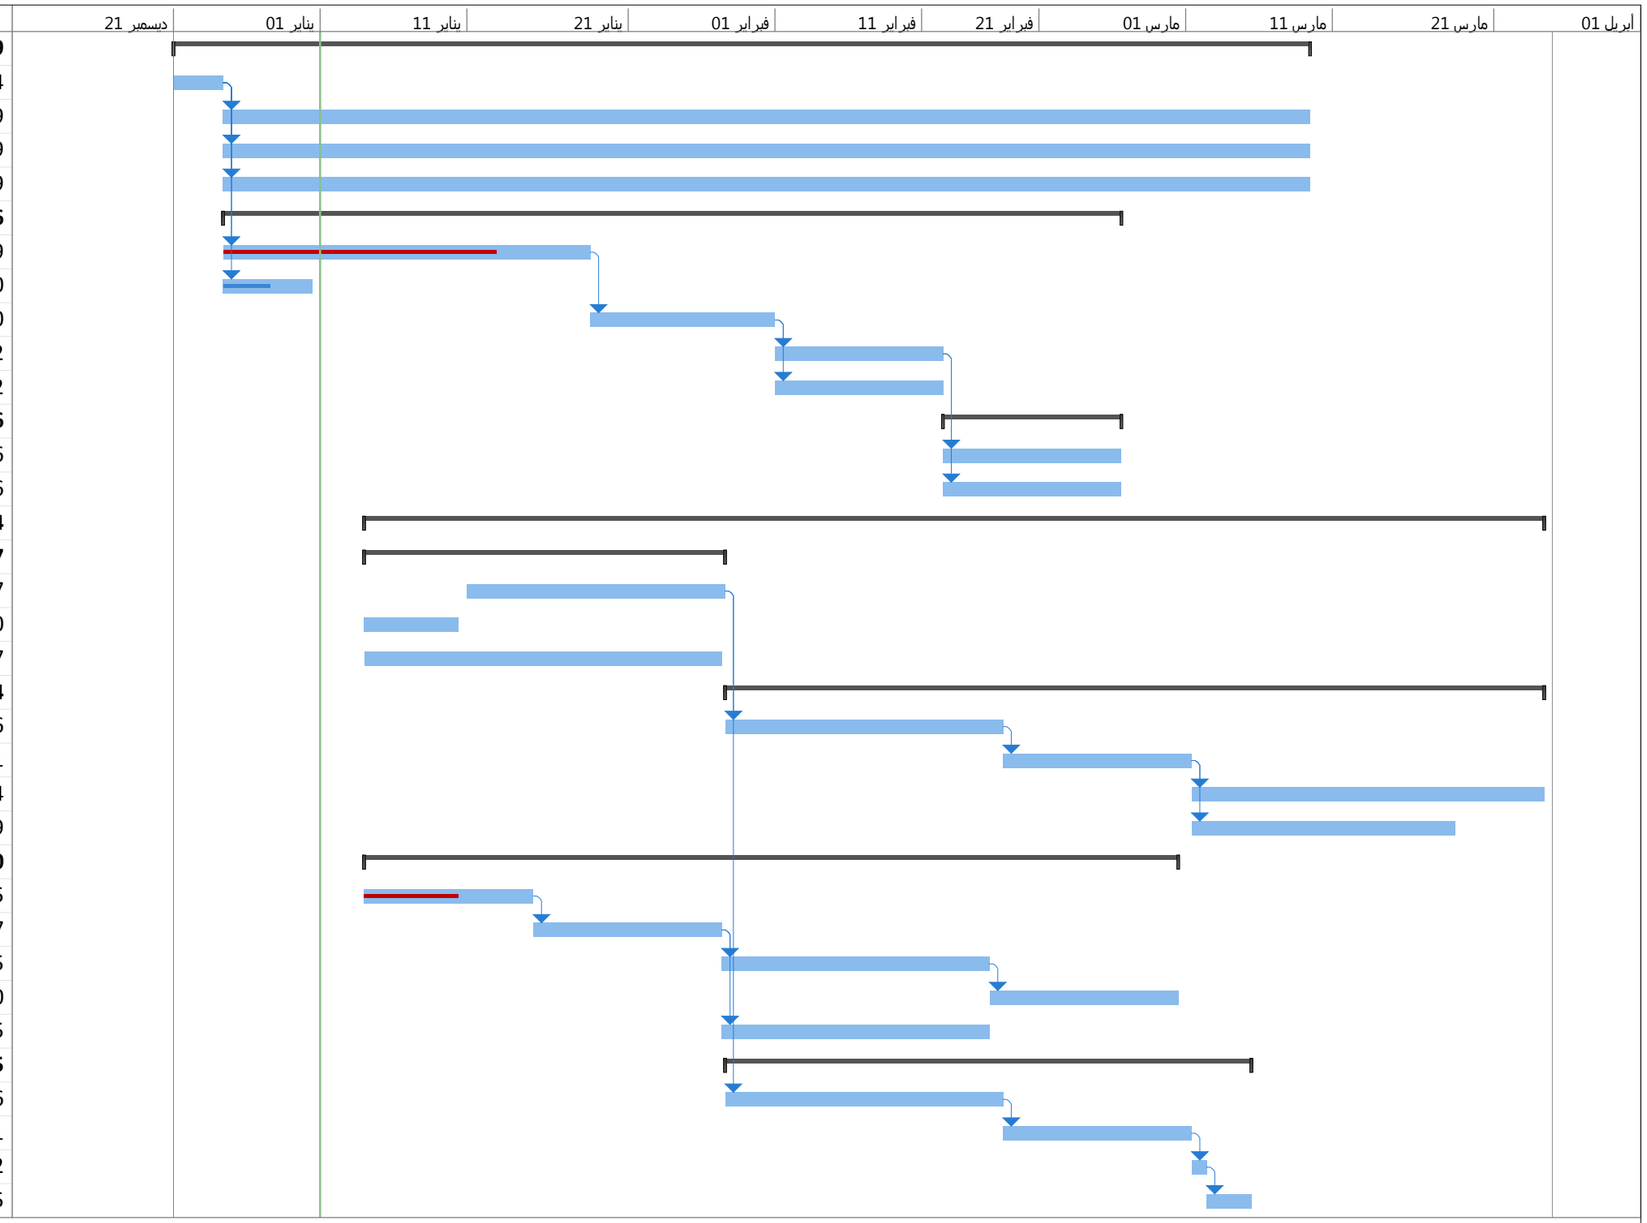

Project: Simple Project Plan
Date: 2018-01-11

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

معرف		اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	انهاء
1		**تشكيل فريق الإدارة الرئيسي :**	**63 ي**	**2018-01-01**	**2018-03-19**
2		تحديد مهام الفرق التي سيتم تشكيلها	3 ي	2018-01-01	2018-01-04
3		الإشراف على باقي الفرق حتى إتمام	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
4		تقديم الدعم اللازم للفرق	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
5		العمل على حل المختنقات وإعداد	3 ش.	2018-01-04	2018-03-19
6		**تشكيل فريق البنية التحتية والاتصالات :**	**50 ي**	**2018-01-04**	**2018-03-06**
7		التواصل مع شركات التقنية العامة	1 ش.	2018-01-04	2018-01-29
8		إعداد قائمة بالجهات التي تتبع مركز	1 أ.	2018-01-04	2018-01-10
9		وضع أساس اتفاق بين الشركة مقدمة	2 أ.	2018-01-29	2018-02-10
10		تجهيز خادمات الشبكة الرئيسية	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
11		تجهيز خادم البريد الإلكتروني	2 أ.	2018-02-10	2018-02-22
12		**إعداد تصور بناء بوابة تبادل**	**10 ي**	**2018-02-22**	**2018-03-06**
13		تطبيقات الأرشفة وإدارة المستندات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
14		موقع داخلي لتبادل البيانات	2 أ.	2018-02-22	2018-03-06
15		**تشكيل فريق البيانات :**	**65.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-04-04**
16		**جمع البيانات**	**20.69 ي**	**2018-01-14**	**2018-02-07**
17		جمع التقارير من الجهات كما هي	3 أ.	2018-01-21	2018-02-07
18		إعداد نماذج تقارير مبدئية لكافة	1 أ.	2018-01-14	2018-01-20
19		دراسة التقارير السابقة (تقارير سبق	4 أ.	2018-01-14	2018-02-07
20		**تصميم المخرجات**	**45 ي**	**2018-02-07**	**2018-04-04**
21		تصميم نماذج مواحدة للتقارير التي	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
22		تصميم آلية إلكترونية لتجميع	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
23		تصميم النظام الذي يتولى جمع	1 ش.	2018-03-11	2018-04-04
24		تحليل البيانات وتصميم التقارير	3 أ.	2018-03-11	2018-03-29
25		**تشكيل فريق التنظيم الإداري :**	**45 ي**	**2018-01-14**	**2018-03-10**
26		حصر مراكز المعلومات بالقطاعات	2 أ.	2018-01-14	2018-01-25
27		وضع تصور موحد لهيكلية مركز	2 أ.	2018-01-25	2018-02-07
28		كتابة الاختصاصات والمهام للوحدات	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
29		وضع منهجية موحدة لعمل مراكز	2 أ.	2018-02-25	2018-03-10
30		وضع آلية التواصل بين مركز	3 أ.	2018-02-07	2018-02-25
31		**ورشة عمل (مركز المعلومات والتوثيق**	**29 ي**	**2018-02-07**	**2018-03-15**
32		إعداد برنامج عمل الورشة	3 أ.	2018-02-07	2018-02-26
33		(الأعمال اللوجستية)الإعداد التنظيمي	2 أ.	2018-02-26	2018-03-11
34		تنفيذ الورشة	1 ي	2018-03-11	2018-03-12
35		تحويل التوصيات إلى برنامج عمل	3 ي	2018-03-12	2018-03-15

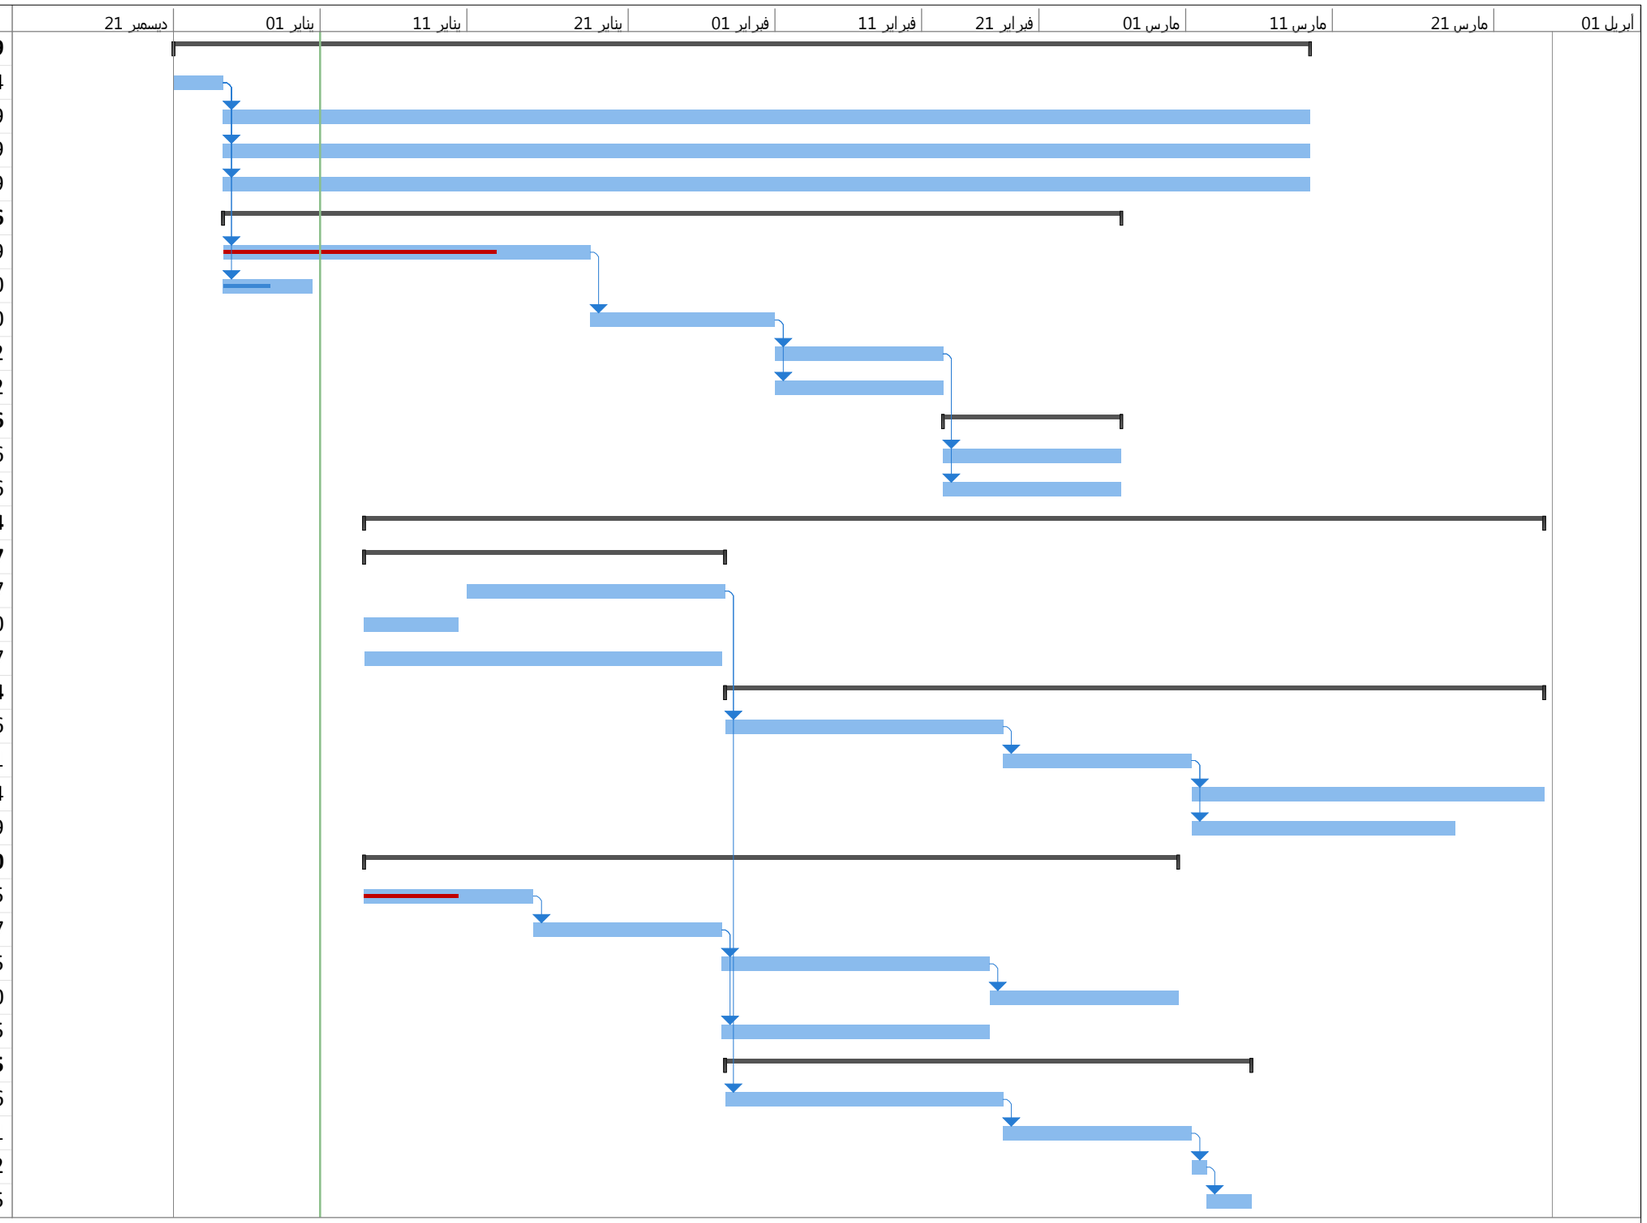

Project: Simple Project Plan
Date: 2018-01-11

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	
